

令和7年5月吉日【第9号】
笠木地区工事安全・連絡協議会

笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。
工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工事概要

『工 事 名』 笠木地区 区画整理第3次・第4次工事

『工事場所』 新潟市西区 笠木 地内

『工事期間』 令和6年3月28日～令和7年8月29日（第3次工事）
令和7年3月27日～令和8年1月30日（第4次工事）

『作業時間』 午前8：00～午後5：00（日曜日は休工）

『工事の問合せ先』

《発注者》

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967

《工事受注者》

 株式会社 吉田建設

第3次 現場代理人 伊丹 宏和


TEL 025-378-1213

第4次 現場代理人 矢部 るり子

TEL 025-201-6003

特例監理技術者 本間 裕

工事施工箇所位置図

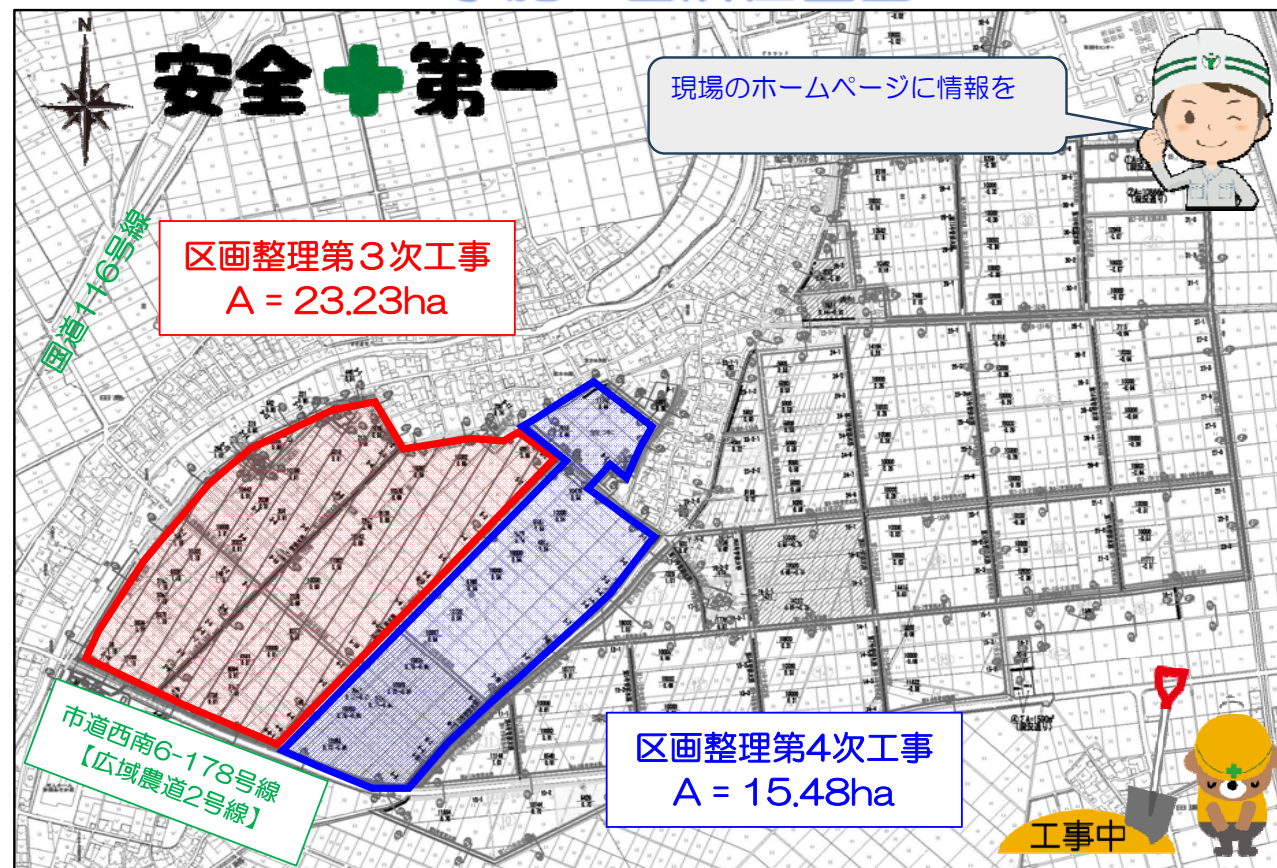

月間工程表【5月】第3次工事

月間安全目標		1.公衆災害の防止										1.転落・転倒災害の防止										1.重機災害の防止										1.公衆災害の防止										玉掛け・ワイヤー 点検色		赤色		
月日・曜日		4月										5月																																		
工種		19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	元請・協力会社	
主要工事の工程	市道横断工	市道本原旧（道路切替）																				仮設迂回道路撤去、土砂運搬												(株) 吉田建設												
	排水路工（開水路） 第3号小排水路	床水フリーム 600×600・800×800、自由勾配取付機降付、第3号合流工、第20号床水横断工																																(株) 吉田建設、(株) 本多建設 (株) 宮川組、(有) 鶴山建設												
	排水路工（開水路） 吉野排水路2号	床水フリーム 1000×1000降付																																(株) 本多建設												
	排水路工（開水路）	第23号床水横断工【広域標準型V1、雑草盛土、路面整形】																																(株) 本多建設 (有) 五十嵐重信建設												
	仮設工																																	仮設道路撤去												
	後片付け																																													
	仮設工 新潟市シールド工事																																													
	交通路導員配置	1人	1人	1人																																	(株) トップロード									
	使用機械・設備等	バックホウ Q1～Q8h3級																																											確認する資格	
		ダンプトラック 2t～10t																																											〔発〕 許 ・自動車免許（普通・中型・大型）	
不整地運搬車 4t																																												〔技能講習〕 ・重機（ダンプトラック、掘削、埋め、積込） ・吊り装置（クレーン） ・不整地運搬車 ・樹山の掘削 ・玉掛け		
散水車 4t																																												〔特別教育〕 ・ローラー運転 ・刈払機		
発電機 20～37KVA																																														
行事予定		安全対策		安否確認		店社安全ハットロール		災害防止協議会		一斉清掃		安否確認		安全協議会		月内点検		安否確認		安全協議会		月内点検		店社安全ハットロール		安否確認		一斉清掃		4月30日現在		集計率 3.194 H		計画 93.5 % 実績 90.2 %												

月間工程表【5月】第4次工事

[illegible]

**週休2日
取組企業宣言**

週休2日+change!!

株式会社 吉田建設

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



持続可能な
開発目標（SDGs）を
支援しています



株式会社 吉田建設



区画整理第3次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在は開排水路【コンクリート二次製品据付】の施工を行っております。

今後の作業は開排水路【自由勾配側溝・排水フリーム】据付・溝畔土工仕上げ、仮設道路の敷鉄板撤去を行う予定となっております。住吉神社前の階段復旧作業は6月上旬を予定しております。皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。

R7.4月末撮影



ボックスカルバート据付完了



排水フリーム据付



砂質土ストックヤード養生シート敷設



第21種排水横断工【水槽】



市道舗装本復旧



区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在は仮設施工ヤードの盛土・敷鉄板、旧構造物撤去【コンクリート・アスファルト】、雑物撤去【木くず・ビニール等】を行っております。今後の作業は硬質塩化ビニル管の布設、コンクリート製品の据付を予定しております。6月中旬に試掘【埋設物調査】市道を通行止めで行う予定です。皆様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう工事を進めていきます。ご協力をお願い致します。

R7.4月末撮影



仮設施工ヤード①

