

ほ場整備工事だより

令和7年6月吉日【第10号】 笠木地区工事安全·連絡協議会



笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。 工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工事概要

『工事名』 笠木地区 区画整理第3次・第4次工事

『工事場所』 新潟市西区笠木地内

令和7年3月27日~令和8年1月30日(第4次工事)

『作業時間』 午前8:00~午後5:00(日曜日は休工)

『工事の問合せ先』

≪発注者≫

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967


≪工事受注者≫

🐈 株式会社 吉田建設


第3次現場代理人 伊丹 宏和TEL 025-378-1213第4次現場代理人 矢部 るり子TEL 025-201-6003

特例監理技術者 本間 裕


工事施工管所位置図

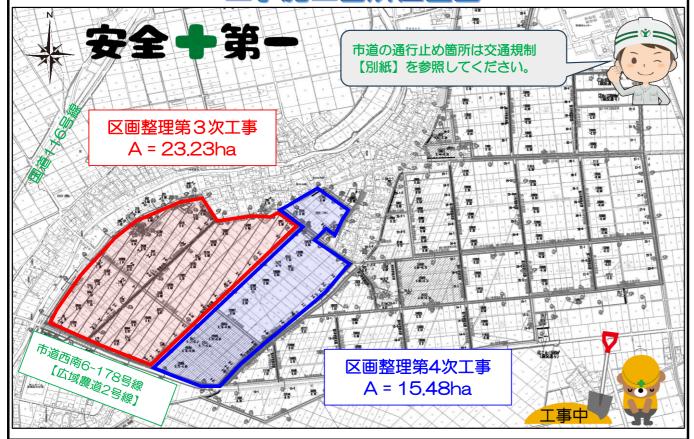

月間工程表【6月】第3次工事

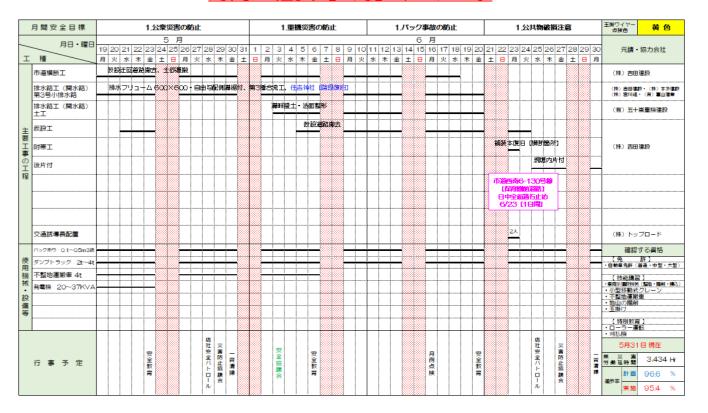

月間工程表【6月】第4次工事

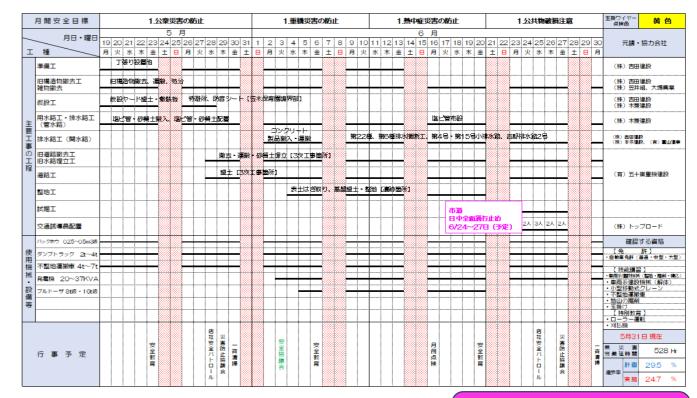



現場のホームページ【第4次工事】 に女性技術者・若手社員日記を掲載 しています。





区画整理第3次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、開排水路【コンクリート二次製品据付】の施工は完了し、仮設迂回道路撤去、溝畔土工の仕上げ作業を行っております。今後の作業は住吉神社前の階段復旧を予定しており、6月23日(月)は保育園前の市道西南6-130号線を日中全面通行止めで舗装本復旧作業を行います。皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。

R7.5月末撮影



第3種合流工【水槽】



第20種排水横断工【ボックスカルバート】



第23種排水横断工【ボックスカルバート】



安全教育【熱中症災害防止】



区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、旧構造物撤去、雑物撤去【木くず・ビニール等】、道路盛土の作業を行っております。 管水路で使用する硬質塩化ビニル管及び開水路のコンクリート製品の搬入も日々行っております。 今後は6月24日(火)~27日(金)試掘【水道管・NTT管】を市道を日中全面通行止め で作業を予定しております。現場内は多数の重機・車両が稼働しており大変危険です。皆様には できる限りご迷惑をおかけしないよう努めますのでご協力をお願い致します。

R7.5月末撮影



振動騒音計設置箇所



仮設施エヤード②



保育園【防音シート設置】



★現場の環境対策

- ●工事関係者(現場代理人・職長)と地域住民の双方が確認できる場所に振動騒音計を設置し監視する。
- ●事前に重機運転条件の違いによる振動騒音の観測数値を重機オペ・作業員を対象に教育・訓練する。
- ●保育園・住宅に接する施工区域は重機の急発進、高速走行、バケットの地盤打撃を禁止し、最大出力を80%に制御した状態で重機を稼働させ振動騒音の低減を図る。

★現場ホームページ【笠木地区 区画整理第4次工事】では問い合わせ窓口を設けております。 トップページ「お問い合わせ」からご質問やご意見・ご要望をお気軽にお問い合わせください。
