

ほ場整備工事だより

令和6年12月吉日
【第4号】
笠木地区工事安全・連絡協議会

笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工事概要

『工事名』 笠木地区 区画整理第3次工事
 『工事場所』 新潟市西区 笠木 地内
 『工事期間』 令和6年3月28日～令和7年8月29日（契約工期）
 『作業時間』 午前8：00～午後5：00（日曜日は休工）
 『工事の問合せ先』

〈発注者〉

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課

TEL 0256-72-0967

〈工事受注者〉

株式会社 吉田建設

TEL 025-378-1213

現場代理人 伊丹 宏和

監理技術者 本間 裕

工事スケジュール

工種	R6												R7																
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月											
準備工	■																												
旧構造物撤去工																													
仮設工																													
旧水路撤去埋立工																													
整地工																													
用水路工（管水路）																													
排水路工（管水路）																													
排水路工（開水路）																													
道路工																													
後片付け																													

現場ホームページに、より詳しい情報を掲載しています。

スマホやパソコンで、工事の情報、若手社員日記などいつでも確認できます。




笠木地区3次工事 吉田建設

検索

<https://kasagichiku3jikouji-hojyou.com/>



工事施工箇所位置図

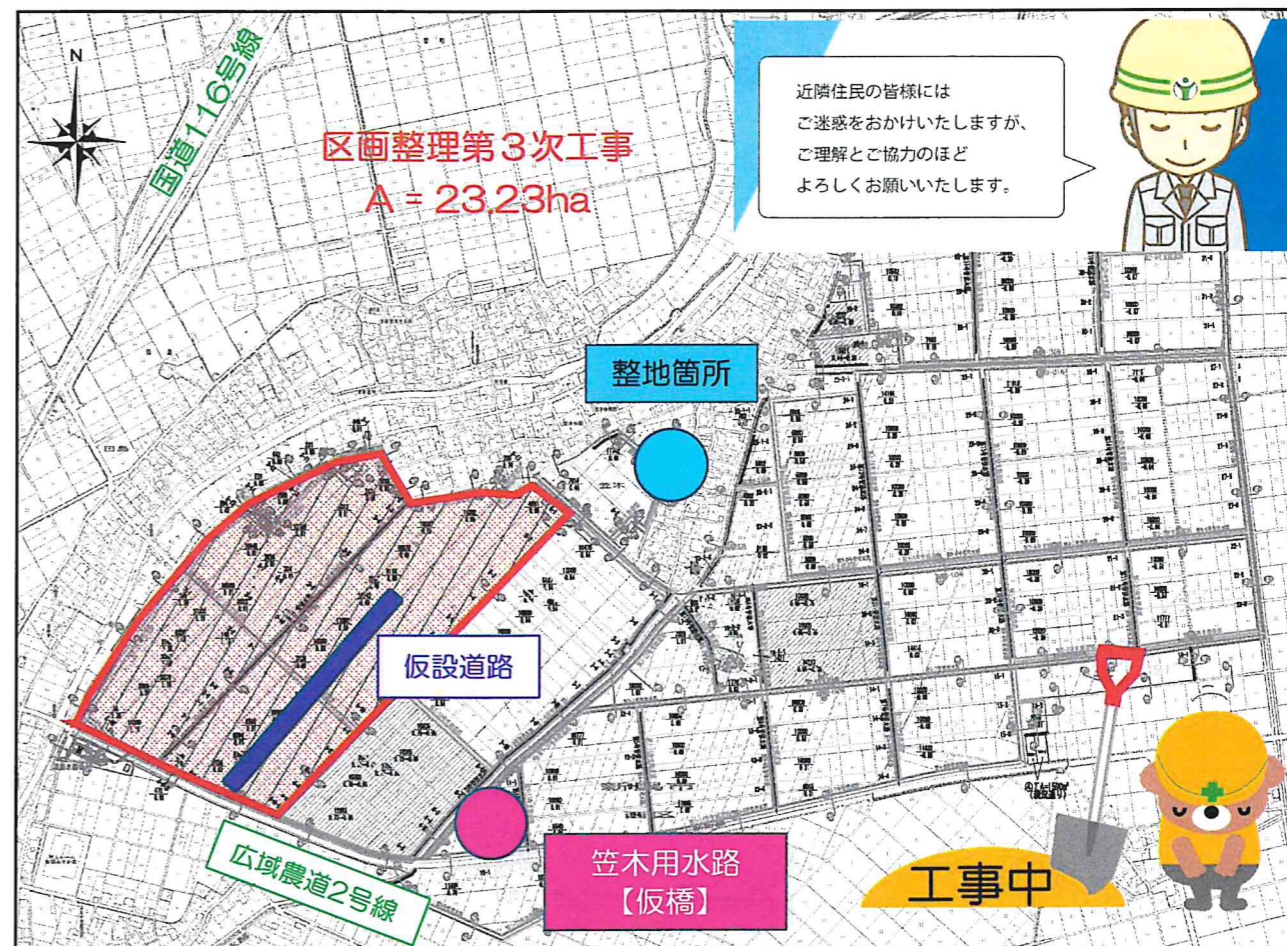

R6.11月末撮影

コンクリート板撤去



// 進捗状況および連絡事項 //

現在はコンクリート構造物の撤去・搬出、雑物撤去（木くず・ビニール等）、開排水路【コンクリート二次製品】及び管用排水路【硬質塩化ビニル管・砂質土】の運搬・配置を行っております。今後はコンクリート二次製品の据付、硬質塩化ビニル管の布設、上記の●の箇所で整地及び笠木用水路【仮橋設置】を予定しております。また、少し遅れていますが広域農道2号線を市道横断する用水管の布設作業のための仮設迂回道路の施工も行います。工事本格的に動きだし工事車両の往来も多くなるため交通事故等の第三者災害が発生しないよう注意して作業を進めます。現場内は多数の重機が稼働しており大変危険です。立ち入りはご遠慮ください。なお、【工事の情報は現場ホームページ】にて公開しております。

